



**MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES (MEF)**



**FONDS D'ASSISTANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (FAES)**

**RAPPORT TRIMESTRIEL (AVRIL-JUIN -2023)**

juillet 2023

## PLAN DU RAPPORT

I. <b>Mission et Structuration du FAES</b> .....	3
II. <b>Contexte d'exécution des programmes</b> .....	4
III. <b>Réalisations technique et financière des programmes pilotés par le FAES (avril- juin 2023)</b> .....	4
<b>3.1 Avancement global des programmes au 30 juin 2023</b> .....	4
Tableau 1: Décompte au 30 juin 2023 des programmes exécutés par le FAES .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3.2 Réalisations spécifiques du FAES durant le trimestre avril-juin 2023</b> .....	17
<b>3.2.1 Réalisations financières des programmes</b> .....	17
IV- <b>Analyse des résultats</b> .....	33
<b>4.1 Principales réalisations du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023</b> .....	33
<b>4-2 Contraintes, atouts et perspectives</b> .....	34

## I. Mission et Structuration du FAES

Le Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES) a pour mission de travailler à l'implémentation des projets et opérations visant à améliorer les conditions de vie des populations démunies dans les zones urbaines et rurales et à accroître leur potentiel productif. (Art.3 / Décret du 3 juin 1990 portant création du FAES). Pour remplir pleinement cette mission, la structure organisationnelle de l'institution comprend actuellement :

- Un Conseil d'Administration composé de neuf (9) membres : le Ministre de l'Economie et des Finances (MEF) ou son représentant, Président ; le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) ou son représentant, Vice-président ; le Ministre des Affaires Sociales ou son représentant, membre ; le Directeur Général du FAES, secrétaire exécutif ; un représentant du FHAF (Fonds Haïtien d'Aide à la Femme), membre ; un représentant de la FHONEP (Fondation Haïtienne de l'Enseignement Privé), membre ; un représentant de la HAVA (Association Haïtienne des Agences Bénévoles), membres ; un représentant de la APA (Association des Producteurs Agricoles) et ; un représentant de la FAN (Fédération des Amis de la Nature).
- Une Direction Générale (DG), composée, entre autres, des Unités de Coordination des Bureaux Régionaux (UCBR) ; de Passation des Marchés (UPM) ; d'Audit Interne (UAI) ; Légale (UL) ; de Communication (UC) ; d'Etude et de Programmation (UEP) et qui coiffe les directions suivantes :
  - Une Direction Administrative (DA)
  - Une Direction Financière (DF)
  - Une Direction des Projets Sociaux (DPS)
  - Une Direction de Promotion et Renforcement Institutionnel (DPRI)
  - Une Direction des Initiatives Economiques (DIE)
  - Une Direction de Lutte Contre la Pauvreté (DLCP)
  - Une Direction du Suivi et de l'Evaluation (DSE)

L'institution dispose de structures déconcentrées ou Bureaux Régionaux dans cinq (5) des dix (10) Départements du pays : Bureau Régional du Nord'Ouest (Port de Paix) ; Bureau Régional du Centre (Hinche) ; Bureau Régional du Nord'Est (Fort liberté) ; Bureau Régional du Sud (Cayes) et ; Bureau Régional du Sud'Est (Jacmel). Ces dernières, sous la direction du Bureau Central (Ouest, Delmas 75) représentent l'Institution sur tout le territoire national, y incluses les zones à hauts risques et les zones d'accès difficiles, et réalisent des missions de supervision de la distribution d'aliments, de plats chauds, de transferts monétaires, etc. Également, elles pilotent la gestion d'autres missions, telles que celles de supervision de la cantine scolaire, la construction, des travaux d'infrastructures (scolaires, de logement, de santé...), des petits projets productifs et de création d'emplois dans les zones les plus reculées et des zones périurbaines du pays...

## II. Contexte d'exécution des programmes

L'exécution des programmes pilotés par le FAES, durant le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023, à savoir avril-juin 2023, comme ce fut le cas pour le second trimestre ; s'est réalisée dans un contexte assez particulier, marqué par un climat sécuritaire difficile, dont les conséquences se révèlent catastrophiques pour le pays, tant sur le plan économique que social. Une telle situation a pénalisé lourdement le secteur économique déjà fragilisé par la crise sanitaire du COVID-19 et contribue à des écarts négatifs entre les réalisations et les prévisions des programmes.

L'inflation continue à rendre difficile la gestion des projets d'infrastructures dans la mesure que les prix des biens et services, sur des périodes relativement courtes, tendent à fluctuer à la hausse dans des proportions considérables. Certains d'entre eux font face, même, à l'insuffisance de fonds qui empêche leur achèvement.

Des catastrophes naturelles résultant : (i) des pluies enregistrées dans la plupart des Départements du pays, les 2 et 3 juin 2023 provoquant plus de 50 décès, l'inondation de plus de 31 mille maisons et 39 mille familles sinistrées (rapport de situation #3, DPC, 5 juin 2023) ; (ii) du tremblement de terre de magnitude 5.5 produit le mardi 6 juin 2023 dans la région de la Grand' Anse provoquant l'effondrement de deux maisons à Jérémie, le décès de trois (3) personnes et de 28 blessés.

La conclusion des contrats et leur gestion s'avèrent compliquées dans un tel contexte. Les demandes de révision de prix ou d'extension de délai d'exécution, notamment pour les marchés de fournitures ou la construction d'ouvrage tendent à devenir la règle et non l'exception, au détriment du respect des coûts convenus et des échéanciers arrêtés.

## III. **Réalisations technique et financière des programmes pilotés par le FAES (avril- juin 2023)**

A travers ce chapitre, sont présentés d'une part, l'avancement global des programmes en cours au 30 juin 2023 et, d'autre part, les réalisations spécifiques du FAES durant le troisième trimestre de l'exercice fiscal en cours.

### **3.1 Avancement global des programmes au 30 juin 2023**

Les caractéristiques et le niveau d'avancement global au 30 juin 2023 des programmes en cours sont présentés dans le tableau ci-après. On peut en déduire que dix programmes étaient en cours d'exécution, dont un (1) nouveau lancé durant le premier semestre de l'exercice en cours. L'état d'avancement technique des programmes varie de 5% à 100 %, pour un état d'avancement financier oscillant entre 0% à plus de 100%.

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes (HA-L1137)	Créer un filet de sécurité sociale à court terme en offrant aux jeunes urbains vulnérables une formation et des opportunités d'emploi	mars 2020	décembre 2023	en cours d'exécution	•USD 40,000,000.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 processus consultatifs réalisés dans 50 sections communales, 13 communes de 6 départements du pays ;</li> <li>• Portefeuille de 429 petits projets élaborés dans les zones précitées : 282 sont clôturés au 30/06/2023</li> <li>• Au total, 59,186 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont bénéficié d'un emploi temporaire dont 22,267 femmes soit 38% ;</li> <li>• Plus de 8 000 jeunes formés en compétences socio-émotionnelles ;</li> <li>• 252 jeunes dont plus de 30% de femmes bénéficiaires d'une formation de 6 mois à la création et la gestion de leur entreprise ;</li> <li>• Une trentaine de cadres du FAES formés sur la gestion de données/Excel</li> <li>• Lancement du Programme de formation professionnelle au profit de 1700 jeunes de 18 à 29 ans lancé (4 mois de formation intensive et 3 mois de stage en entreprise avec possibilité d'emploi);</li> <li>• Lancement du Programme de formation en apprentissage</li> </ul>	USD 26,070,451.41	65	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi de la mise en œuvre des petits projets lancés</li> <li>• 50 jeunes dont 30 % de femmes au moins bénéficiaires d'une formation de 6 mois à la création et la gestion d'entreprise ;</li> <li>• Formation du personnel cadre du FAES sur la passation des marchés ;</li> <li>• Supervision du Programme de formation professionnelle de 1700 jeunes (en eau et énergie) et 25 autres en apprentissage numérique</li> <li>• Reconstruction des Réseaux LAN et Electrique du Bureau Central du FAES ;</li> <li>• Démarrage de la phase de test et mise en opération du système d'intermédiation du travail au profit du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) ;</li> <li>• Poursuite des travaux de soutien technique au MAST pour le renforcement de</li> </ul>

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
						<p>numérique selon la méthodologie bootcamp lancé au profit de 27 jeunes (4 mois formation 5 mois stage) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inauguration de la Direction de la Main d'œuvre logeant le bureau d'intermédiation du travail réaménagé par FAES pour Ministère des Affaires Sociales et du Travail</li> <li>• La préparation d'outils de communication : site web, brochures en créole et en français, diffusion de spot dans les radios/campagne d'information pour la sélection des jeunes devant être formés professionnellement ;</li> <li>• Mise en place d'un système de gestion de données sur les petits projets d'infrastructures sociales et les bénéficiaires touchés via la plateforme COMMCARE avec la firme DIMAGI ;</li> <li>• Audit technique/évaluation de la composante I du Programme : 2020-2021-2022 ;</li> <li>• 2 opérateurs recrutés par FAES pour la formation professionnelle de haute qualité au profit de 1725 jeunes de 18 à 29 ans</li> </ul>				<p>Poffre de service pour les demandeurs d'emploi, les employeurs, la stratégie de gestion des ressources humaines et de la performance du service public de l'emploi au profit du MAST ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception d'un plan de réseau d'information pour soutenir la gouvernance entre les bureaux nationaux et locaux du MAST pour Haïti.</li> <li>• Modernisation du Système d'archivage du FAES</li> <li>• Suivi de la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle ;</li> <li>• Signature du contrat avec le bureau conseil /Test d'assurance qualité du système d'intermédiation du travail</li> </ul>

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception et mise en place d'un système d'Intermédiation du travail au profit du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (phase test)</li> <li>• Actualisation du manuel d'opération du FAES (en cours) ;</li> <li>• Travaux de réaménagement de certains espaces de bureaux au FAES ;</li> <li>• Matériels informatiques, roulant acquis au profit du FAES et du MAST ;</li> <li>• Appui au financement en énergie verte des 5 bureaux régionaux du FAES ;</li> <li>• Démarrage du contrat de mise en place du système d'Information sur le Marché du Travail pour le MAST ;</li> <li>• Appui à l'électrification des 5 bureaux régionaux du FAES</li> <li>• Démarrage du contrat relatif au soutien technique à fournir au MAST pour le renforcement de l'offre de service pour les demandeurs d'emploi, les employeurs, la stratégie de gestion des ressources humaines et de la performance du service public de l'emploi</li> </ul>				

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
Expansion des Filets de protection pour les personnes vulnérables affectées par les conséquences socio-économiques du Coronavirus (HA-J0001)	Continuer à garantir des niveaux minimums de qualité de vie pour les personnes vulnérables durant la crise provoquée par la COVID-19	juillet 2021	août 2024	en cours d'exécution	USD 70,000,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Services de cantines scolaires au profit de 115,584 élèves ;</li> <li>• Transferts monétaires non-conditionnés pour améliorer la sécurité alimentaire de 3258 ménages choisis parmi les populations vulnérables</li> <li>• 2258 ménages ont participé aux travaux de création d'actifs communautaires</li> <li>• 2190 femmes vulnérables ont bénéficié d'un appui pour améliorer leur situation alimentaire</li> <li>• Services complémentaires de formation vocationnelle et aide au loyer et de bourse d'étude à 68 femmes vulnérables ;</li> </ul>	USD 44,911,020.50	64%	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continuer avec la cantine scolaire pour le mois de juillet au profit des élèves bénéficiaires ;</li> <li>• Compléter les 4 cycles de transferts monétaires non-conditionnés pour améliorer la sécurité alimentaire de ménages vulnérables</li> <li>• Réaliser les 200 petits projets communautaires permettant d'octroyer un revenu temporaire aux ménages vulnérables</li> <li>• Compléter les cycles de transferts dédié aux femmes vulnérables victimes de violences sexuelles.</li> <li>• Finaliser les formations vocationnelles et compléter les autres services dédiés à ces femmes vulnérables</li> <li>• Compléter les enquêtes pour les ménages à inscrire dans le SIMAST</li> </ul>
Programme de renforcement des filets de sécurité pour les populations vulnérables	Contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et à accroître la résilience à	Nov. 2022	oct. 2025	en cours d'exécution		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accord de don publié dans le moniteur en novembre 2022</li> <li>• Lancement du Projet réalisé le 16 mai 2023</li> </ul>	0	0%	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferts monétaires non conditionnés au profit de 40 000 ménages</li> <li>• Emploi temporaire au profit de 12 000 ménages</li> </ul>



Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
(HA-J0005)	moyen et long terme des populations vulnérables en Haïti.				USD 60,000,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éligibilité des décaissements obtenue le 28 juin 2023</li> <li>• Élaboration de TDR des opérateurs en cours</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferts et services complémentaires au profit de 22 000 ménages</li> <li>• Expansion SIMAST de 92 000 ménages</li> <li>• Des interventions du GHESKIO et du PIH atteindront 110 000 bénéficiaires grâce aux transferts apportés à 22 000 individus dont 80% seront des femmes.</li> <li>• Renforcement, via OIM, de la plateforme d'assistance aux déplacés internes du GOH, de la conception et de la mise en œuvre de protocoles pour soutenir les rapatriés, en transférant progressivement les responsabilités aux homologues haïtiens renforcés.</li> </ul>
Programme de Réhabilitation de 28 écoles	Remettre en état les bâtiments scolaires endommagés dans le but d'Améliorer la qualité de l'éducation	2018	2020	En cours d'exécution	299,000,000.00 Gourdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réhabilitation de l'EFA de Belle-anse</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Mare Briole</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Baie d'Orange</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Cyvadier</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Dougé</li> <li>• Réhabilitation de l'EFA de Meyer</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale d'Exina Gilles</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale d'Edèze Gousse</li> </ul>	234,517,375.31	78%	61%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Dumont</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Laborde</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale Caïman</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Casse</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale Notre Dame de Lourdes</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale Potus</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Métayer</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Champy</li> <li>• Réhabilitation de l'Ecole Nationale Herrivaux</li> <li>• Ecole Nationale des Amazones de Côtes-de-Fer dans le Département du Sud-Est</li> </ul>

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Fort Ogé</li> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Morne à Brûler</li> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Bellevue</li> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Lavanneau</li> <li>•Réhabilitation de l'EFPA de Beaumont</li> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Duchity</li> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Plaine Martin</li> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Mixte de Moron</li> <li>•Réhabilitation du Lycée Congréganiste St Martin de Prouesse</li> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de L. Sicard de Pèlerin</li> <li>•Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Caïman</li> </ul>				
Programme de Renovation des Pôles Régionaux et Locaux de Développement	Le programme compte construire, finaliser, réhabiliter et/ou rénover environ une cinquantaine de projets d'infrastructures sociales, culturelles, économiques et	2018	2023	En cours d'exécution	330,000,000.00 Gourdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bétonnage de 70 ml de route à Corail Lamothe dans la commune de Belle Anse</li> <li>• Bétonnage de 125 ml de route à Morne Zombi dans la commune de Thiotte</li> <li>• Adoquinage de 120 ml à l'impasse Martineau dans la commune de Jérémie</li> </ul>	217,222,423.40	81%	84%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalisation des travaux de construction d'une école communale à Laschobas dans le département du centre (Catherine Flon à Morène, 1ère section Petit Fond)</li> <li>• Finalisation des travaux de bétonnage de 250ml du tronçon de route dans la commune de Maniche dans le Département du Sud</li> </ul>

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
	de justice sur le territoire national					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Construction d'un ponceau dans la commune des Cayes</li> <li>•Réhabilitation de deux tronçons de route dans les quartiers de Fort St-Michel (Rue Gabart) et Vertières (Rue Tabernacle) de la commune du Cap-Haitien.</li> <li>•Construction de 400 mètres linéaires du tronçon de route Morisseau-l'Asile.</li> <li>•Construction de trois (3) terrains de jeux multidisciplinaires dans les communes de Port-Salut, de Chardonnières et de Cavaillon.</li> <li>•Construction de 300ml de rue dans la commune de Ouanaminthe</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>•Finalisation des travaux de construction d'une école de formation technique dans la commune de Limbé dans le Département du Nord</li> <li>•Finalisation des travaux de construction de 3 places publiques dans le Plateau Central</li> <li>•Finalisation des travaux de construction d'un ponceau dans la commune des Cayes</li> <li>•Finalisation des travaux de construction du marché communal de Gros-Morne</li> <li>•Finalisation des travaux de construction des blocs B et C du centre culturel de Jean Rabel.</li> <li>•Finalisation des travaux de construction du marché communal de Gros-Morne</li> <li>•Finalisation des travaux de construction des blocs B et C du centre culturel de Jean Rabel.</li> <li>•Finalisation des travaux de construction du centre culturel de l'Anse-a-Veau dans le département des Nippes (Phase 1 / Module 1&amp;2)</li> </ul>
Programme de Structuration Territoriale et de Développement	Le programme compte construire, finaliser, réhabiliter et/ou rénover environ une soixante-dizaine de projets d'infrastructures sociales, culturelles,	2019	2023	En cours d'exécution	496,000,000.00 Gourdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bétonnage de 150ml de route de la 5ème Section Baliverne de Dame-Marie du Département de la Grand'Anse.</li> <li>•Bétonnage de 550 ml de reliant Carrefour Norée à Fleury via Estiverne dans la commune de Chambellan du</li> </ul>	219,197,094.7	44.19%		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Finalisation des travaux d'extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale St-Joseph de Frederic</li> <li>•Finalisation des travaux d'extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Damier Jessé</li> <li>•Finalisation des travaux d'extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de</li> </ul>

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
	économiques et de justice sur le territoire national.					Département de la Grand'Anse. • Bétonnage de 90ml de la ruelle Derzneau/Brutus à Ravine Trompette dans la commune de Pilate • Bétonnage 794 m2 de route à Morne Savon (Mago) dans la commune de Pilate • Erection d'un mur de clôture de 300ml du terrain de jeu de Roseaux. • Construction d'un poste de Police à Privilé dans la commune de Jérémie • Construction de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Parotie de Carrefour-Sanon de Jérémie dans le Département de la Grand-Anse • Erection d'un mur de clôture de 245.77ml du cimetière de la commune de Grand-Gosier • Bétonnage de 250ml de la route d'accès au marché public de Thiotte • Réhabilitation du marché public de Thiotte • Bétonnage de 150 ml de route à Morne Moreau dans la commune de Bainet dans le Département du Sud-Est				l'Ecole Nationale de Ray Poste • Finalisation des travaux de construction du Marché public de Niel dans la commune de Marchand Dessalines • Extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Altary • Extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Mirault • Finalisation des travaux de construction de la place publique de Trou Bois dans la localité de Duchity, 5eme section communale de Peste • Finalisation des travaux de construction du Lycée National de Plaisance du Sud dans le département des Nippes / 1ère phase. • Finalisation des travaux de construction de 15 logements sociaux à Degerme, 4ème section communale de Lasserique de la commune d'Abricot dans le département de la Grand-Anse • Finalisation des travaux de construction du complexe administratif de Moron • Construction d'une place publique à Carcasse situé dans la commune de Les Trois • Réhabilitation de la plage publique Laissez-Moi de Miragoane • Construction de 1.5km de canal de drainage a Lagaudray sur la route de

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bétonnage de 200 ml de route à Watapana dans la commune de Jacmel dans le Département du Sud-Est</li> <li>• Bétonnage de 154 ml de route à Mayard dans la commune de Jacmel dans le Département du Sud-Est</li> <li>• Bétonnage de 65 ml de route à Labidou dans la commune de Jacmel dans le Département du Sud-Est</li> <li>• Bétonnage de 246 ml de route à Bréman dans la D32 commune de Jacmel dans le Département du Sud-Est</li> <li>• Construction d'un passage à gué à Pérédo dans la Commune de Marigot dans le Département du Sud-Est</li> <li>• Réhabilitation de la place publique Biassou de Saint Raphael dans le Département du Nord.</li> <li>• Erection d'un mur de clôture de 104ml du Sous-commissariat de Cadush à Morne Pelée dans la commune de Quartier Morin</li> <li>• Bétonnage de 70ml de la route Galman Duplan, 1ère section communale de BASSE PLAINE, Quartier Morin, Département Nord</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Port-Salut dans la commune de Cayes</li> <li>• Réhabilitation du marché public de Boury et érection de 56.88ml de gabion de la rive gauche de la rivière Lacoriere</li> <li>• Réhabilitation du captage de Formond situé dans la 1ère section communale de Torbeck</li> <li>• Construction de passerelle sur la Ravine "O Boeuf" menant à Melon, 3ème section communale de Maniche</li> <li>• Bétonnage de 320 ml de rue dans le centre-ville de Maniche</li> <li>• Finalisation du tribunal de paix de Mare-Rouge</li> <li>• Construction d'un lycée des jeunes filles dans le Département du Nord</li> <li>• Bétonnage de rue à Ravine Trompette dans la commune de Pilate / Phase 2</li> <li>• Installation d'équipements de sport dans 5 places publiques dans le Département de l'Ouest</li> </ul>

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction d'un impluvium à Dimois, section communale de Beaumont</li> <li>• Construction de 10 hangars au marché public de Désriveaux dans la localité de Jean Bellune, 3e section communale de Pestel</li> <li>• Bétonnage de 150 ml route Bellevue Palais des Rois, Limonade, Département Nord.</li> <li>• Bétonnage de 70 ml de route de la rue Nativité à Dame-Marie dans le Département de la Grand-Anse.</li> </ul>				
Accès à une Education de Qualité en Haïti (ACEQH)		juillet 2014	décembre 2022	Achévé	627,413,570.00				100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme achevé en décembre 2022</li> </ul>
Programme de Reconstruction d'Infrastructures d'Éducation et de Santé / KOWEIT/FNE		2012		En cours d'exécution	441,350,987.55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction du lycée Roseline VAVAL à Petit Goâve</li> <li>• Construction du lycée de Petit trou de Nippe</li> <li>• Construction du lycée de Débouchette en cours</li> <li>• Sous bassement et ferrailage / construction de l'hôpital de San Fil</li> </ul>	271,395,302.56	61.49%	52%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalisation de la Construction du lycée de Débouchette de la commune de St Jean du Sud</li> <li>• Construction d'un hôpital</li> </ul>
Programme d'urgence multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion des groupes vulnérables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle des populations vulnérables ;</li> </ul>	1er Octobre 2022	30 Septembre 2023	En cours d'exécution	16 036 858 720.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45600 plats chauds ont été distribués gratuitement aux couches les plus vulnérables</li> <li>• 115613 rations sèches ont été distribuées gratuitement aux couches les plus vulnérables</li> </ul>	1,102,677,414.4	6,87%	14%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 restaurants communautaires seront alimentés à cinq reprises</li> <li>• 190 mille rations alimentaires seront distribuées aux couches vulnérables</li> <li>• 540 mille transferts monétaires de 5 mille gourdes à raison de 4 cycles</li> </ul>

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réduire la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et le taux de malnutrition des ménages vulnérables</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>480 approvisionnements des restaurants communautaires réalisés</li> <li>56,951 ouvriers de la SONAPI ont reçu les 2 paiements de 3,400 gourdes</li> <li>49,888 personnes vulnérables ont reçu le premier paiement de 3,000 gdes</li> <li>49,515 personnes vulnérables ont reçu le deuxième paiement de 3,000 gdes</li> <li>45700 ouvriers de la SONAPI ont reçu un transfert monétaire de l'ordre de 5,000 gourdes</li> </ul>				<p>(135 mille paiements par cycle seront réalisés)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>254300 subventions de 5 mille gourdes seront octroyées à 60 mille ouvriers à raison de 5 paiements par ouvrier.</li> <li>488825 parents d'écoliers vont recevoir à deux reprises un transfert monétaire de l'ordre de 7500 gourdes.</li> </ul>
Programme Kore Pèp /TAIWAN (1 <sup>ère</sup> phase)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle des populations vulnérables</li> </ul>	Avril 2023	Septembre 2023	En cours d'exécution	880 000 000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribution de 181,300 rations sèches de produits alimentaires dans les Départements de l'Ouest et du Nord</li> <li>Approvisionnement de 28 Restoran Kominoté dans le Nord ;</li> <li>Distribution de 6,000 plats chauds dans le département de l'Ouest.</li> </ul>	311,376,426.7	35,38%	35%	<ul style="list-style-type: none"> <li>60,227 plats chauds seront distribués gratuitement à des personnes vulnérables, en situation d'insécurité alimentaire ou à des personnes sinistrées à travers les départements programmés.</li> <li>Au moins 158,345 rations sèches de produits alimentaires « Panye Solidarite » seront distribuées à des ménages vulnérables, en situation d'insécurité alimentaire et à des personnes vulnérables à travers les 10 départements géographiques sur la période programmée.</li> <li>268 approvisionnements</li> <li>Dans un premier temps, 120 restaurants (1<sup>er</sup> cycle) d'approvisionnement communautaires seront</li> </ul>

Titre du programme	Objectif	Date de début	Date de fin	Statut <sup>1*</sup> du projet :	Coût total du programme	Actions déjà entreprises	Etat d'avancement global au 30 juin 2023			Activités à entreprendre
							Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisation des activités	
										<p>localisés dans des zones vulnérables pour être approvisionnés et les plats chauds produits seront vendus à bas prix aux usagers sur la période programmée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans une seconde phase, 148 restaurants communautaires seront localisés dans des zones vulnérables pour être approvisionnés et les plats chauds produits seront vendus à bas prix aux usagers sur la période programmée</li> </ul>

Statut :  
-à l'arrêt,  
-en cours d'exécution,  
-achevé



### 3.2 Réalisations spécifiques du FAES durant le trimestre avril-juin 2023

Le pays traverse une période difficile. Il a connu une croissance négative du PIB durant ces 5 dernières années. Plus de 4, 9 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire et l'inflation est à deux chiffres. En outre, la violence, les problèmes de circulation des biens et des personnes d'un bout à l'autre du pays, les dérèglements naturels dus au changement climatique assombrissent davantage le tableau. C'est pourquoi, le Gouvernement Haïtien et certains Bailleurs de fonds, à travers le FAES, ont vu la nécessité de continuer, au cours du trimestre avril-juin 2023, avec leurs interventions en appui aux plus vulnérables de la population haïtienne. Les principales réalisations au cours de cette période sont présentées ci-après.


#### 3.2.1 Réalisations financières des programmes

Au cours du trimestre avril-juin 2023, le FAES dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes a pu décaisser plus de 93 millions de gourdes haïtiennes et de 16.3 millions de dollars des États Unis d'Amérique. Ces montants de décaissements sont répartis par programme dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Répartition des décaissements du FAES par programme (avril-juin 2023)

Libellé du programme/composante/sous-composante/produit/activité/sous-activité	Monnaie	Trimestre (avril-juin 2023)
1. Programme Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes (HA-L1137)	USD	1,625,028.00
2. EXPANSION FILETS DE SÉCURITÉ pour les populations vulnérables affectées par les conséquences socio-économiques du COVID-19 (HA-J0001)	USD	12,752,530.01
3. Programme d'Urgence Multisectoriel d'Apaisement et de Réinsertion de Groupes Vulnérables	HTG	76,283,162.50
4. KORE-PEP / TAIWAN	USD	1,867,177.00
5. Programme de Structuration Territoriale et de Développement (PSTD)	HTG	6,070,457.25
6. Programme de Rénovation des Pôles Régionaux et Locaux de Développement (PRPRLD)	HTG	0.00
7. Programme de Rehabilitation de 28 ecoles	HTG	0.00
8. Programme d'Amelioration de l'Acces a une Education de Qualite en Haiti	USD	-
9. Programme de Reconstruction d'Infrastructures d'education et de Sante / KOWEIT	USD	-
Dotation Budgétaire	HTG	10,625,902.00


## Contribution des programmes dans les decassements effectués par le FAES (avril-juin 23)

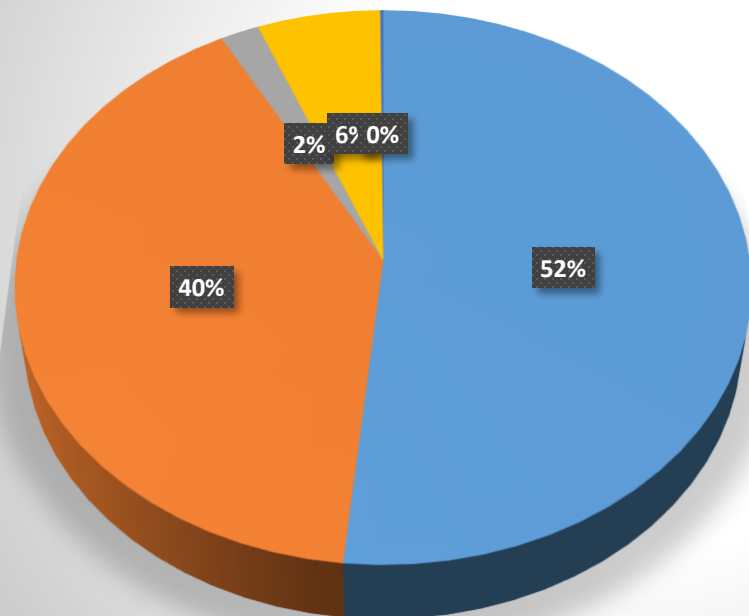


- 1. Programme Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes (HA-L1137)
- 2. EXPANSION FILETS DE SÉCURITÉ pour les populations vulnérables affectées par les conséquences socio-économiques du COVID-19 (HA-J0001)
- 3. Programme d'Urgence Multisectoriel d'Apaisement et de Réinsertion de Groupes Vulnérables
- 4. KORE-PEP / TAIWAN



Variation de la performance financière du FAES par programme (avril-juin 2023)

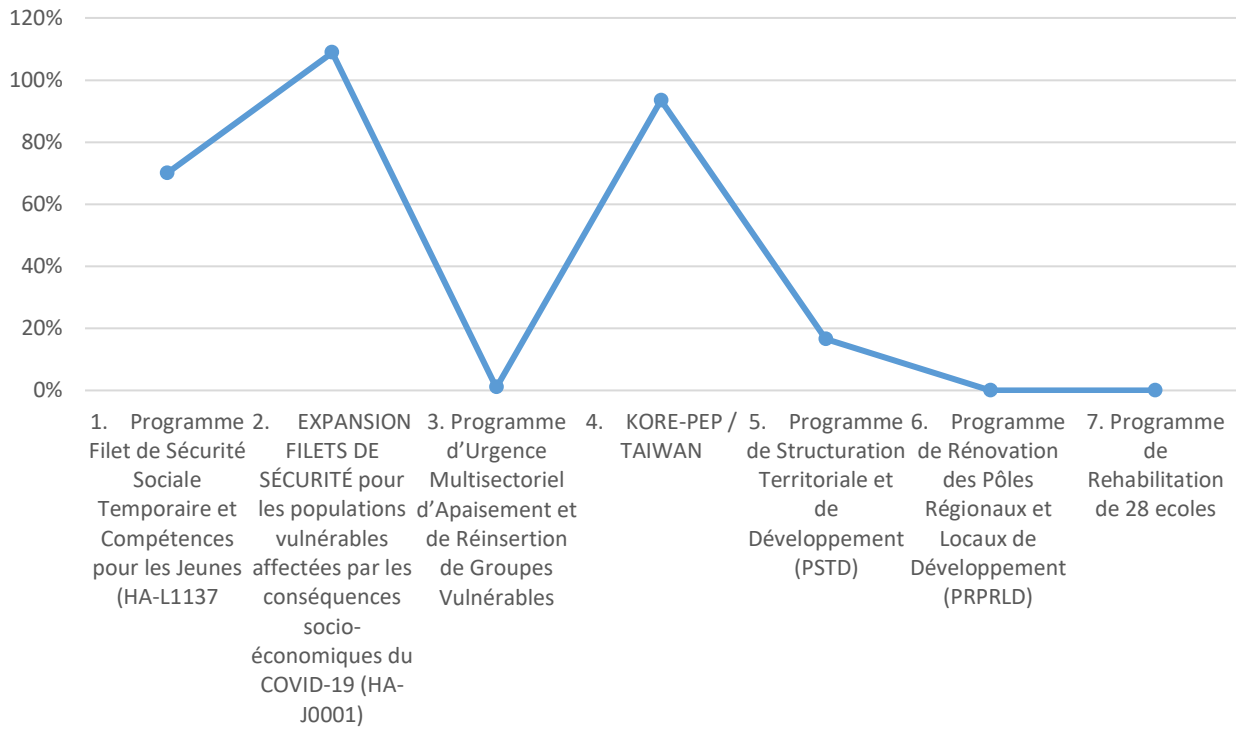


## Evolution de la performance des programmes du FAES par trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023

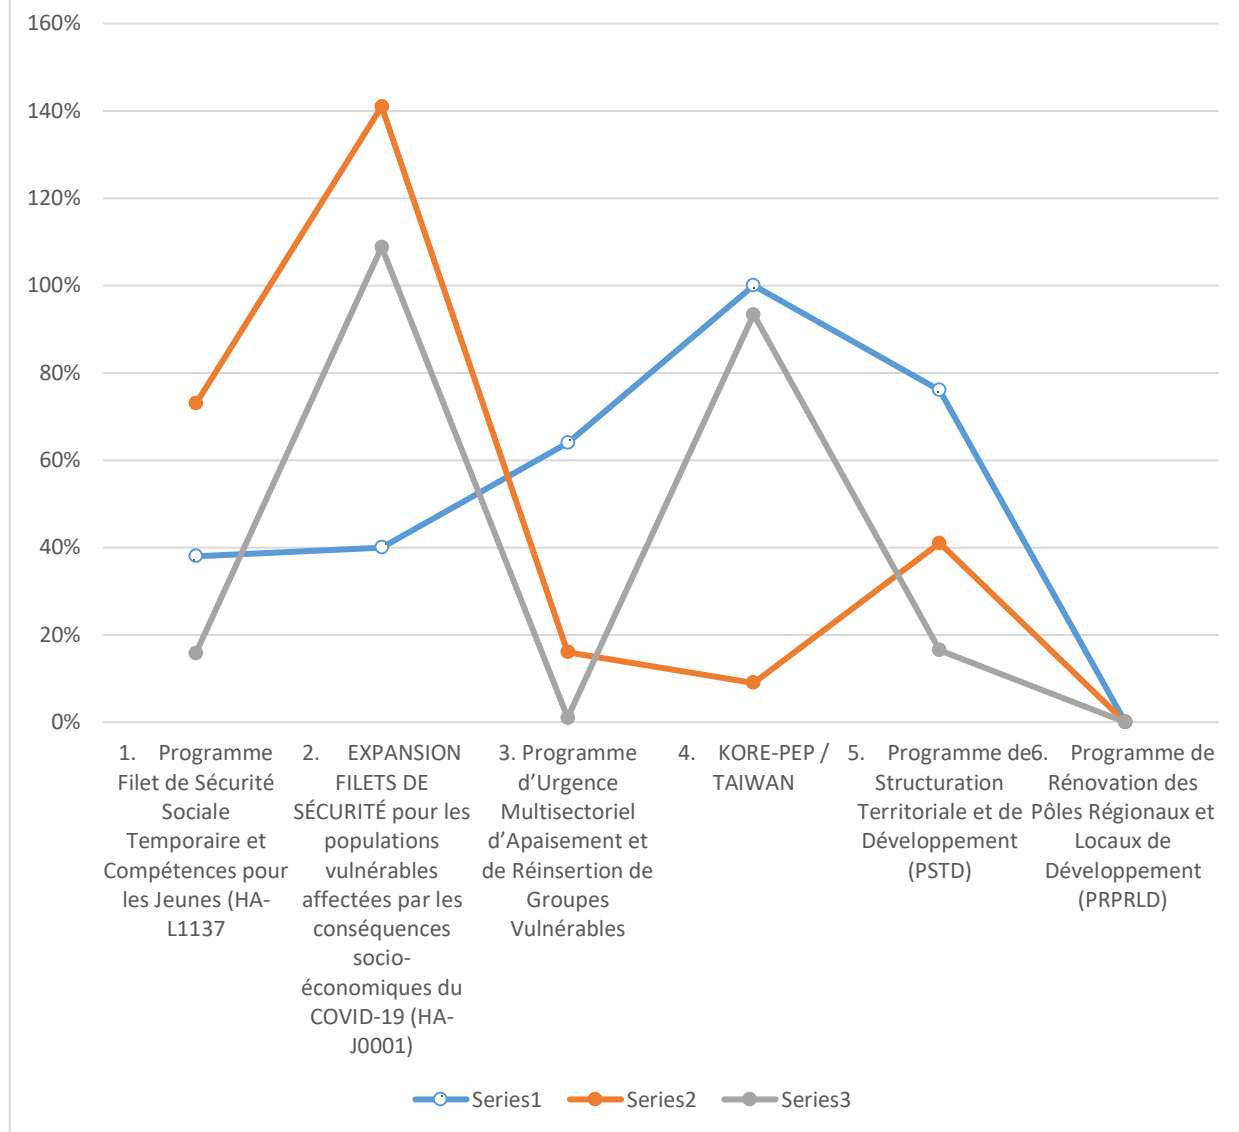

Serie 1=Trimestre 1; Serie 2= Trimestre 2; Serie 3= Trimestre 3 de l'exercice fiscal 2022-2023

### Variation du niveau de consommation du Budget 2022-2023 des programmes au 30 juin 2023

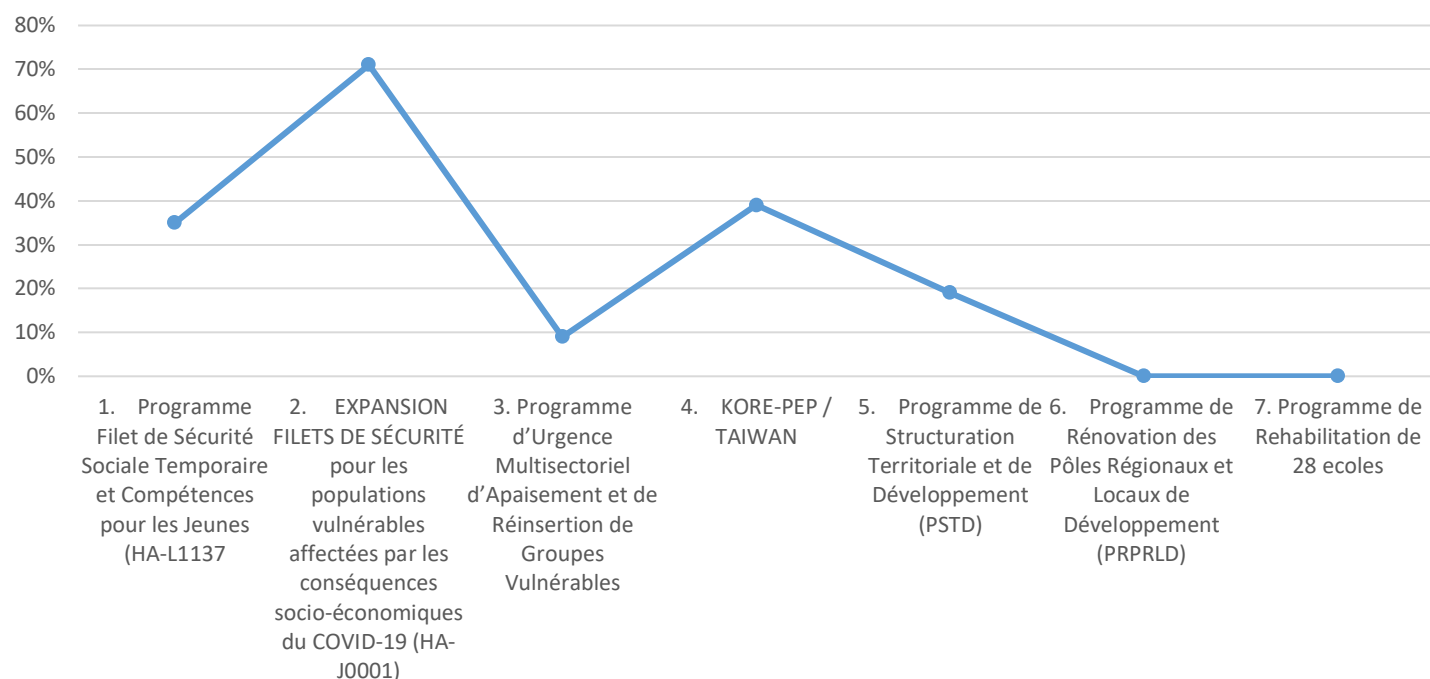

### 3.2.2 Réalisations techniques

Le Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES), dans le cadre de sa mission d'accompagner les communautés défavorisées vers l'amélioration de leurs conditions de vie, a financé, à travers six (6) principaux programmes en cours, les activités primordiales suivantes au cours du trimestre allant de janvier à mars 2023 :

Tableau 2: Principales réalisations techniques / Chiffres clés/ Bénéficiaires touchés par programme durant le trimestre janvier-mars 2023

Programme	Réalisations (avril-juin 2023)	Nombre de bénéficiaire (s)
<b>Programme d'Urgence Multisectoriel pour l'Apaisement et la Réinsertion Sociale des Groupes Vulnérables (PUM)</b>	- Transfert monétaire conditionnel	- 45,700 ouvriers
<b>Programme d'Assistance sociale KORE-PEP</b> Source de financement : TAIWAN	- Distribution de rations sèches de produits alimentaires dans les Départements de l'Ouest, du Nord.	- 141,200 ménages vulnérables
<b>Programme de Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes (HA-L1137)</b>	- Formation sur la gestion de données / Excel	- Une trentaine de cadres du FAES
	- Mise en place d'une plateforme technologique d'intermédiation du travail (en cours)	- Le MAST
	- 87 projets réceptionnés permettant de créer 14339 emplois	- 14,339 jeunes bénéficiaires d'emploi
	- 147 projets de création d'emplois lancés	- 9800 jeunes bénéficiaires d'un emploi

Programme	Réalisations (avril-juin 2023)	Nombre de bénéficiaire (s)
	- Formation en compétence socio émotionnelle	- 1388 jeunes dont 38 % de femmes
	- Formation en apprentissage numérique lancée	- 25 jeunes
<b>Programme d'Expansion des filets de sécurité pour les personnes vulnérables affectées par les conséquences socio-économiques du Corona Virus (HA-J0001)</b>	Distribution de repas scolaires	44 299 élèves dans 126 écoles de 6 départements.
	Distribution de transfert monétaires non conditionnes	48 699 ménages vulnérables
	Processus participatif en vue de réaliser 200 petits projets à haute intensité de main d'œuvre dans les Départements de la Grand-Anse, des Nippes et du Nord-Ouest	15 000 ménages vulnérables
	Transfert monétaires et Distribution de kits alimentaires spécifiques pour les femmes victimes de violences sexuelles et autres maltraitances	5 000 femmes vulnérables dans la zone Métropolitaines
	Finalisation des enquêtes des ménages à intégrer dans le SIMAST	52 000 ménages
	Support loyer	41 femmes vulnérables
	Bourses scolaires attribuées	8 ménages
	Réalisation de tests au COVID 19	385 personnes vulnérables

### 3.2.3 Quelques actions phare réalisées par le FAES au cours du trimestre avril-juin 2023

Le FAES au cours du trimestre avril-juin 2023 a réalisé avec la collaboration de ses principaux partenaires de nombreuses activités, dont les principales sont présentées dans les pages subséquentes.

**Quelques actions phare réalisées durant le trimestre avril-juin 2023 dans le cadre du Programme d'Urgence Multisectoriel d'Apaisement et de Réinsertion Sociale des Groupes Vulnérables (PUM) lancé par le Gouvernement Haïtien.**

- Le FAES, avec l'appui du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) et en collaboration avec ADIH, continue d'apporter son soutien aux ouvriers de la sous-traitance. Il a procédé à de nouveaux transferts monétaires, un total de 45700 ouvriers de 31 usines de la sous-traitance ont reçu 5000 gourdes. Cette initiative vise à soutenir les ouvriers face à l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché haïtien, en leur octroyant une aide financière de 5000 gourdes par mois pendant cinq (5) cycles, ce qui doit leur servir à couvrir les frais de transport et de repas. Les fonds en question sont transférés sur les comptes des différentes compagnies retenues qui, à leur tour, devront payer les mensualités de la subvention à leurs employés respectifs.

**Quelques actions phare réalisées durant le trimestre avril-juin 2023 dans le cadre d'une convention de partenariat entre le Gouvernement haïtien et la République de Chine-Taiwan portant sur le financement des activités du programme Kore Pèp en vue de continuer à supporter la population haïtienne.**



Photo 1 : Distribution de 1000 kits alimentaires aux riverains de Pacot à Ti Savann et à Croix Desprez, le 8 mai 2023



Photo 2 : distribution de 1500 kits alimentaires aux riverains de Canape-vert, Poste Machan et à Fort National place Sapatann (FAES, 1<sup>er</sup> mai 2023)

Cette initiative est réalisée dans le cadre de la Coopération bilatérale entre le Gouvernement haïtien et la République de Chine-Taiwan pour la mise en œuvre du programme Kore Pèp.





Photo 3 : Transfert alimentaire lors de la Célébration de la fête du Drapeau au Cap-Haitien, ce 18 mai 2023



Photo 4 : Distribution de 6000 plats chauds les lundi 26 et mardi 27 juin 2023 au Bel Air à l'occasion de la fête Patronale Notre Dame du Perpétuel Secours.



Photo 5 : Distribution de 1500 kits alimentaires dans les localités de Meyotte, Delmas 24 et Solino (FAES, 5-7 mai 2023) Cette intervention du FAES bénéficie du support de la République Chine Taïwan qui a signé une convention de partenariat avec le gouvernement haïtien portant sur le financement des activités du Programme Kore Pèp.





Photo 2 : Aide aux victimes des intempéries des 2 et 3 juin 2023.

Selon la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), le dernier bilan partiel de ces intempéries s'élève à 51 morts, 140 personnes blessées, 18 disparues, 31 591 maisons inondées et 49 458 familles sinistrées dans les zones touchées. Le FAES est la première institution à apporter sa contribution dans le cadre de la réponse à ces intempéries. Pour soutenir les victimes, le FAES a livré des milliers de kits alimentaires dans plusieurs régions du pays grâce au soutien de la République Chine-Taïwan qui a signé une convention de partenariat avec le FAES portant sur le financement des activités du Programme « Kore Pèp » :

- Lundi 5 juin : 1000 kits à la DGPC pour être distribués dans les communes de Tabarre et de Cité Soleil.
- Mardi 13 juin : 3000 kits alimentaires aux victimes des intempéries se trouvant dans la commune de Léogâne.

**Quelques actions phare réalisées par le FAES durant le trimestre avril-juin 2023 avec le support de la BID**



Photo 6 : Des jeunes entrepreneurs ayant exposé leurs produits ce mercredi 17 mai à l'hôtel Montana.

Ils font partie de 5 cohortes de jeunes entrepreneurs qui ont été formés pendant 6 mois par la fondation CASELI, l'un des opérateurs recrutés par le Fonds d'Assistance Économique et Sociale, pour exécuter un projet d'incubation d'entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Filet de sécurité Sociale temporaire et compétences pour les jeunes. En effet, pendant 3 ans à travers « Haïti Startup Talent », la Fondation Caseli soutiendra des jeunes qui ont des idées d'affaires ou des « Startups », innovantes et à fort potentiel de croissance.



**Photo 7 : Lancement du Programme de renforcement des filets de sécurité pour les populations vulnérables (Hôtel Karibe Convention Center, 16 mai 2023)**

Le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES) a organisé ce mardi 16 mai un atelier de lancement du Programme de renforcement des filets de sécurité pour les populations vulnérables (HA-J0005) à l'hôtel Karibe Convention Center. Ce nouveau Programme est financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) à hauteur de 60 millions de dollars et vise à réduire l'insécurité alimentaire et à accroître la résilience des ménages vulnérables à moyen et long terme. Ce programme est le quatrième filet de sécurité temporaire mis en œuvre par le FAES financées par la BID depuis 2018 pour soutenir les populations vulnérables à travers les dix départements géographiques du pays.



**Photo 8 : Séance de formation sur la thématique Gestion des parties prenantes dans les zones de conflit (Hôtel Karibe du 14 au 16 juin 2023)**

La Fondation Association des Volontaires pour le Service International (AVSI) a organisé à l'hôtel Karibe du 14 au 16 juin une séance de formation sur la thématique "Gestion des parties prenantes dans les zones de conflit" dans le cadre du Programme HA-J0001 "Expansion des filets de sécurité pour les personnes vulnérables affectées par les conséquences socio-économiques du Coronavirus" financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID). Cette activité vise notamment à renforcer les capacités institutionnelles du FAES.





**Photo 9 : Inauguration des locaux rénovés de la Direction de la main d'œuvre du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST, le 2 juin 2023)**

Les travaux ont été effectués dans le cadre du projet « Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes » exécuté par le FAES avec l'appui financier de la Banque Interaméricaine de Développement (BID).



**Photo 10 : Clôture par le FAES de concert avec PADF et VIVARIO, de la phase 1 de la première composante du Programme Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes (Hôtel Karibe, 25 mai 2023)**

Le FAES de concert avec la Pan American Development Foundation (PADF) et VIVARIO, ses Opérateurs et partenaires de mise en œuvre d'activités, a organisé une journée porte ouverte ce jeudi 25 mai à l'hôtel Karibe Convention Center pour marquer la clôture de la phase I de la première Composante du Programme "Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes". Cette activité s'est déroulée autour du thème « Lajenès se lavni, ann met men pou konstwi lakay ». Cette phase du Programme s'est achevée avec succès ; 220 petits projets ont été réalisés et 49, 226 bénéficiaires ont été atteints dans les quartiers les plus vulnérables de treize communes du pays.

La PADF et son partenaire Vivario, ont eu trois zones d'intervention couvrant les communes de Port-au-Prince, Cité-Soleil, Carrefour, Miragòane et Petit-Goâve durant la mise en œuvre de ce Programme qui offre aux jeunes une formation socio-émotionnelle favorisant le renforcement du capital social, la cohésion sociale au sein des communautés ciblées. Ainsi, plus de 200 petits projets, identifiés et priorisés par les communautés à partir des problèmes auxquels ils sont confrontés, ont été réalisés. Ces travaux ont permis de toucher environ 50000 personnes dont 36% de femmes, a affirmé Cédrelle Jean-Louis, directrice pays de la PADF. Pour elle, la journée porte ouverte se veut une restitution, un partage de ces réalisations avec le public et ce, dans un souci de transparence.

Globalement, à la phase I, 282 projets dont 220 avec la PADF et la Viva Rio ont été clôturés. Actuellement des dispositions sont en cours en vue du démarrage de 150 autres dans les zones d'interventions ciblées.



**Photo 11 : Lancement officiel par le FAES, avec l'appui du MAST, de la formation d'une vingtaine de jeunes en apprentissage numérique selon la méthodologie bootcamp (16 juin 2023)**

Cette initiative entre dans le cadre de la deuxième composante du Programme « Filet de Sécurité Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes » relative à la formation professionnelle au profit de 1700 jeunes.

Ledit programme de l'Etat haïtien, a été financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID). La firme spécialisée "Le Wagon" est chargée de réaliser la formation en question à partir d'un partenariat avec l'ESIH (à définir). A noter, que les jeunes ciblés ont été sélectionnés sur la base de tout un ensemble de critères comme l'âge (entre 18 à 29 ans), le niveau de formation académique, la localisation pour ne citer que ceux-là. La période de formation théorique est de 4 mois suivi de 5 mois de stage en entreprise avec possibilité d'emploi.





**Photo 12 : Cérémonie de remise par GHESKIO de certificats en cosmétologie, cuisine et pâtisserie à 150 jeunes femmes vulnérables (9 juin 2023)**

L'activité a été réalisée grâce au support du Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES) dans le cadre du Programme "Expansion des Filets de sécurité pour les personnes vulnérables affectées par les conséquences socio-économiques du Coronavirus HA-J0001" financé par la BID.



**Photo 13 : Transfert monétaire aux ménages vulnérables de Cité Soleil (AVSI, 29 avril 2023)**

Cette initiative est réalisée dans le cadre du Programme Expansion des Filets de Sécurité pour les personnes vulnérables affectées par les conséquences socio-économiques du Coronavirus financé par la BID et mis en œuvre par le Gouvernement haïtien à travers le Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES).



Photo 14 : Transfert monétaire par AVSI aux ménages vulnérables des quartiers de Matissant, La joie, La paix, Village de Dieu, Manigat, Anba Mapou 1 et 2, Cité Kabrit, Bò Pylone, etc. (FAES, 27 avril au 3 mai 2023)

Cette activité intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Expansion des Filets de Sécurité financé par la BID au profit des personnes vulnérables affectées par les conséquences socio-économiques du Coronavirus.





Photo 15: Formation au profit de 100 jeunes de la commune de Cité Soleil, 50 jeunes de Carrefour, 51 jeunes de Miragoâne et 51 jeunes de Petit-Goâve sur les thématiques définies, entre autres, la prévention contre le choléra, la prise en charge communautaire, l'hygiène personnelle et le traitement de l'eau (FAES, avril 2023)



#### IV- Analyse des résultats

L'analyse des résultats du FAES au cours du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023 repose sur l'identification des principales réalisations, des contraintes, des atouts et des propositions de solutions.

##### 4.1 Principales réalisations du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023

Les principales interventions du FAES au cours de la période du rapport sont réalisées en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population par la mise en place d'un filet de sécurité sociale suivant une logique modulaire garantissant l'accès pour tous à l'alimentation, au logement, aux soins de santé et à l'éducation. On peut noter spécifiquement :

- La poursuite de la mise en œuvre par le FAES des programmes suivants : (i) deux (2) programmes financés par la BID, HA-L1137 et HA-J0001, respectivement en appui au Gouvernement Haïtien à la stabilisation sociale et à la gestion du COVID-19 ; (ii) le Programme d'Urgence Multisectoriel pour l'Apaisement et la Réinsertion Sociale des Groupes Vulnérables (PUM) ; (iii) le programme Kore- Pèp, grâce à une convention de don de 10 millions de dollars des États-Unis d'Amérique provenant de TAIWAN signée avec le FAES et le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) ; (iv) les Programmes d'infrastructures, particulièrement celui de Structuration Territoriale et de Développement (PSTD)

Grâce à ces programmes, les principales réalisations suivantes ont été enregistrées au cours du trimestre avril-juin 2023 :

- **PUM** : Transfert monétaire à 45,700 ouvriers du secteur de la sous-traitance de la SONAPI
- **Kore Pèp/TAIWAN** : Distribution de rations sèches de produits alimentaires dans les Départements de l'Ouest, du Nord à 141,200 ménages vulnérables.
- **HA-L1137** : Formation d'une trentaine de cadres du FAES sur la gestion de données / Excel ; poursuite de la mise en place d'une plateforme technologique d'intermédiation du travail ; réception de 87 projets permettant de créer 14339 emplois ; lancement de 147 projets au profit de 9800 jeunes bénéficiaires d'emplois ; formation de 1388 jeunes dont 38% de femmes en compétence socio émotionnelle ; lancement de la formation en apprentissage numérique au profit de 25 jeunes.
- **HA-J0001** : Transferts monétaires non conditionnés à 48 699 ménages vulnérables ; lancement de 200 petits projets à haute intensité de main d'œuvre dans les Départements de la Grand-Anse, des Nippes et du Nord-Ouest au profit de 15 000 ménages vulnérables ; transferts monétaires et distribution de kits alimentaires 5 000 femmes vulnérables dans la zone Métropolitaine ; finalisation des enquêtes auprès de 52,000 ménages à intégrer dans le SIMAST ; réalisation de tests au COVID 19 au profit de 385 personnes vulnérables...

Globalement, ces principales interventions sont réalisées grâce : (i) à un investissement d'un montant de plus de 93 millions de gourdes haïtiennes et de 16.3 millions de dollars des États Unis d'Amérique et ; (ii) aux dépenses courantes effectuées à partir des fonds de la dotation budgétaire du Trésor Public, qui s'élèvent à 10,625,902.00 de gourdes pour le trimestre considéré. Ces fonds sont répartis par bailleurs de la manière suivante : BID, environ USD 14,440,000; TAIWAN, environ USD 1,867,000.00 ; Trésor Public, environ 93,000,000 gourdes.

## 4-2 Contraintes, atouts et perspectives

Au cours de la période, certaines contraintes (interne et externe) déjà identifiées au cours du précédent trimestre ont continué à ralentir la bonne marche des activités. Cependant le FAES, grâce, entre autres : (i) à l'appui du Ministère de l'Économie et des Finances, du Ministère des Affaires Sociales, de son Conseil d'Administration, de la BID ; ii) à l'expertise de ses Opérateurs Prestataires de Services recrutés, de ses cadres répartis tant au Bureau central que dans les Bureaux Régionaux et ; (iii) à la bonne collaboration offerte par les autorités locales et les bénéficiaires directs de ses interventions, a pu diminuer l'incidence des contraintes rencontrées sur la mise en œuvre de ses opérations. A ce sujet, il y a lieu de citer, entre autres :

1. Lenteur dans le processus de passation de marché dont l'explication la plus plausible est le temps long pris par le CNMP et la CSCCA pour traiter les dossiers qui leur sont acheminés.
2. L'insécurité qui pousse tout un chacun à rendre difficile et très risqués les déplacements à travers le pays.
3. Des difficultés de trouver des soumissionnaires qualifiés pour certains marchés, obligeant la republication des offres et/ou le rallongement du délai de soumission.
4. Des cas de retard des opérateurs dans la livraison de certains livrables prévus dans leur contrat ;
5. L'épuisement des frais de gestion et du budget d'investissement de certains programmes provoquant des faiblesses dans le suivi et la supervision et même des arrêts de certains projets sur le terrain.

En guise de perspectives :

A. Le FAES continuera à miser sur :

- (i) Le support de ses partenaires techniques, financiers, la collaboration de ses cadres et de toutes les autres parties prenantes de ses interventions.
- (ii) Les programmes sociaux financés par le Trésor Public et TAIWAN, dont le Programme multisectoriel pour l'apaisement et la réinsertion de groupes vulnérables (PUM) et le programme KORE-PEP de façon à mieux répondre aux besoins de la population affectée par des chocs d'origine diverse ;

- (iii) Les fonds d'autres Bailleurs de fond internationaux, particulièrement la BID, pour boucler les interventions des programmes Filets de Sécurité Social en cours qui ont permis, entre autres, de réaliser des centaines de petits projets et de créer des milliers d'emplois au profit des jeunes du pays.
  
- B. Le FAES poursuivra la recherche de nouveaux fonds pour continuer la mise en œuvre des projets qui sont à l'arrêt, initier d'autres interventions complémentaires et/ou supplémentaires et atteindre d'autres groupes non encore touchés par ses interventions ;
  
- C. Le FAES fera tout pour respecter les exigences statutaires en organisant à temps les réunions de son Conseil d'Administration et en mettant en application les recommandations de ce dernier, telles que la poursuite du processus de renforcement institutionnel, l'amélioration constante du système de rapportage et de communication dans l'optique d'une plus large vulgarisation des réalisations de l'institution et de la promotion de la transparence dans la gestion des programmes et projets de développement.
  
- D. Le FAES prendra les mesures de mitigation des risques associés à la mise en œuvre des programmes et projets qu'il met en œuvre afin de maximiser l'atteinte de leurs objectifs.
  
- E. Enfin, le FAES dans un court délai va présenter aux membres de son Conseil d'Administration : (i) une version révisée de son budget annuel 2022-2023 en vue de prendre en compte les contraintes de toutes sortes auxquelles il est confronté dans la mise en œuvre des programmes au cours dudit exercice ; (ii) son budget de l'exercice fiscal 2023-2024 pour pouvoir en recevoir à temps l'approbation, boucler l'exercice fiscal en cours et démarrer en bonne et due forme le prochain exercice fiscal.
